GuauRdería

Hotel para caninos

🐾 Planificación de Sprints — GuauRdería v3.0

Criterio MoSCoW orientado a conversión · Marco Scrum · Sprints de 2 semanas

PROYECTO	PBIS PLANIFICADOS	SPRINTS	CAMBIO VS V2
Sitio Web GuauRdería	**18 historias**	**4 sprints · ~8 semanas**	**SP recalibrados**

¿Por qué construimos en este orden? — Lógica de conversión

💡 El sitio web tiene un único objetivo de negocio

GuauRdería no vende en línea ni procesa pagos. Su sitio web tiene un propósito concreto y medible: **transformar a un visitante desconocido en un lead calificado**, es decir, alguien que envió el formulario de evaluación inicial o contactó por WhatsApp. Cada decisión de qué construir primero responde a una sola pregunta: *¿esto acerca al usuario a ese momento, o lo aleja?*

Priorización en base al embudo de conversión del visitante para generar valor

ETAPA 1 · DESCUBRIMIENTO

"¿Qué es esto y es para mí?"

El visitante llega por primera vez. Necesita entender en segundos qué ofrece el servicio y si su perro califica.

Resuelto en Sprint 1 — Semana 2

ETAPA 2 · EVALUACIÓN

"¿Tiene lo que necesito y hay cupo?"

El visitante ya está interesado. Necesita comparar servicios y verificar disponibilidad en sus fechas antes de contactar.

Resuelto en Sprint 2 — Semana 4

ETAPA 3 · CONFIANZA

"¿Puedo confiarle a mi perro?"

El visitante quiere contratar pero duda. Necesita evidencia: fotos reales, opiniones de otros tutores y credenciales del establecimiento.

Resuelto en Sprint 3 — Semana 6

ETAPA 4 · DECISIÓN

"¿Cuánto me cuesta exactamente?"

El visitante ya confía. Quiere calcular el costo final, filtrar opciones y leer respuestas a sus dudas antes de confirmar.

Resuelto en Sprint 4 — Semana 8

Criterios de priorización aplicados

MUST HAVE
Imprescindibles para que el MVP opere y genere clientes reales. Sin estos el sistema no cumple su propósito.

SHOULD HAVE
No bloquean el MVP pero mejoran conversión y confianza significativamente.

COULD HAVE
Aportan calidad y posicionamiento. Valor diferencial, no esencial al inicio.

WON'T HAVE
No necesarios para el MVP público. Se evalúan en una futura Épica E-06.

Decisión clave de esta versión: El registro de usuario (PBI-06) y la recuperación de contraseña (PBI-07) se mueven a **WON'T HAVE** para el MVP. Ninguna historia de las Épicas E-01 a E-04 requiere autenticación para generar valor real al cliente o al negocio. Eliminar este bloque libera ~14 SP y reduce la complejidad técnica (sesiones, hashing, tokens), permitiendo un MVP funcional en 4 sprints en lugar de 5.

Resumen global del plan

4	18	88	8	6
Sprints planificados	PBIs incluidos	Story Points totales	Semanas de desarrollo	MUST HAVE en Sprint 1-2

Sprint 1 — MVP mínimo: el negocio existe y se puede contactar

Semanas 1–2 | MUST HAVE

SPRINT GOAL

Un visitante puede conocer el servicio, entender qué ofrece, verificar que su perro puede ingresar y contactar directamente al establecimiento. El negocio puede recibir sus primeros leads reales.

PBI	HISTORIA DE USUARIO (RESUMEN)	ÉPICA	PRIORIDAD	SP	JUSTIFICACIÓN
PBI-01	Sitio web principal: propuesta de valor, 6 beneficios, diseño responsivo	E-01	MUST	**5**	*Sin presencia digital no existe nada más. Máxima prioridad absoluta.*
PBI-13	Sección "Requisitos Sanitarios" accesible desde navegación principal, sin login	E-01	MUST	**3**	*Condición de admisión del modelo de negocio. Evita visitas al recinto sin cumplir condiciones. Bajo esfuerzo.*
PBI-12	Botón de contacto por WhatsApp, visible en sección de contacto y/o flotante	E-04	MUST	**2**	*Canal de conversión directa e inmediata. Historia mínima (botón + enlace). Máximo ROI por esfuerzo.*
PBI-05	Formulario de evaluación inicial: campos obligatorios, validaciones, mensajes de estado	E-04	MUST	**5**	*Principal mecanismo de captación de leads. Sin esto el negocio no puede calificar clientes nuevos.*

✅ ***Entregable:*** *Sitio visible, con identidad, requisitos de admisión y dos canales de contacto activos. El negocio puede recibir leads desde el día 1.*

15 SP

Configuración en Jira

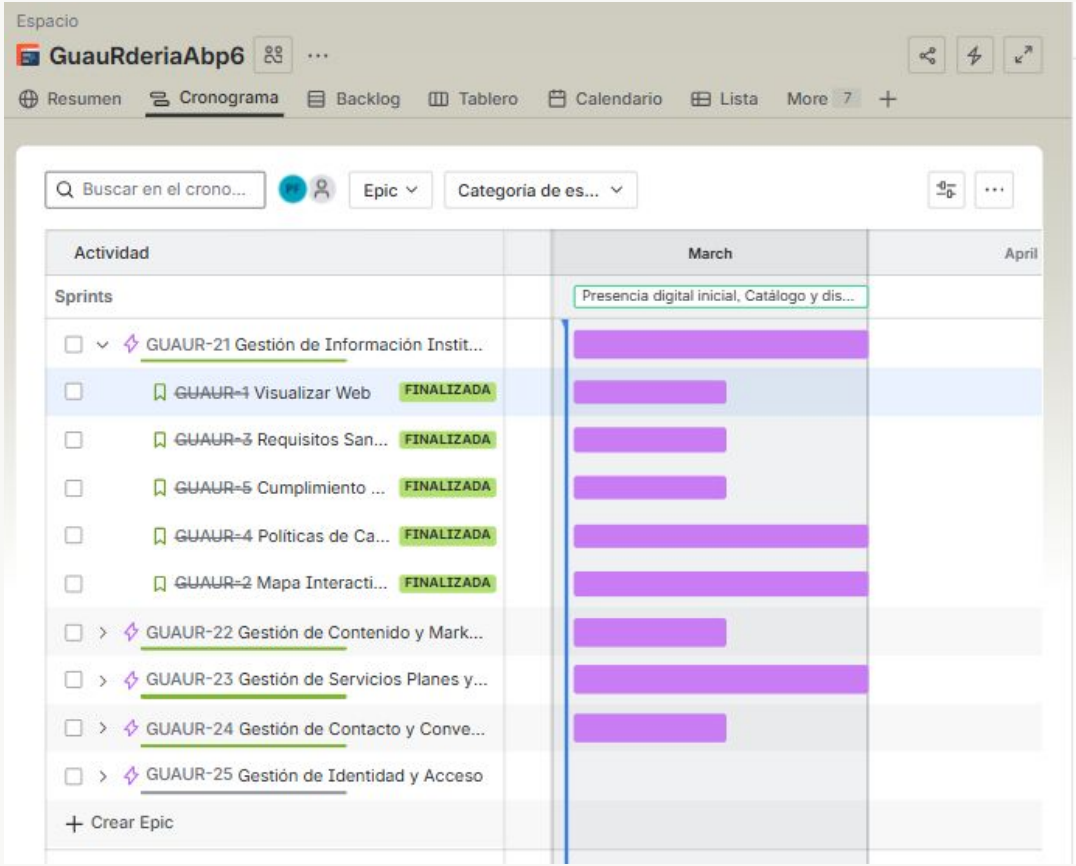

Sprint 2 — Catálogo y disponibilidad: el usuario puede evaluar y decidir

Semanas 3–4 | MUST HAVE completado

SPRINT GOAL

El usuario puede explorar los servicios disponibles, comparar opciones y consultar si hay cupo para sus fechas, todo sin necesidad de registrarse. Se completan los 6 MUST HAVE del MVP.

PBI	HISTORIA DE USUARIO (RESUMEN)	ÉPICA	PRIORIDAD	SP	JUSTIFICACIÓN
PBI-02	Listado comparativo de servicios: nombre, precio, moneda, descripción y ≥1 atributo adicional (≥3 visibles a la vez)	E-03	MUST	**8**	*El usuario debe entender qué puede contratar. Prerequisito técnico directo de PBI-03, PBI-09 y PBI-15.*
PBI-03	Consulta de disponibilidad: seleccionar servicio + rango fechas, resultado "Disponible / No disponible"	E-03	MUST	**8**	*Evita consultas innecesarias al establecimiento y frustración del usuario. Depende de PBI-02.*
PBI-11	Ubicación del establecimiento: dirección en texto + enlace a Google Maps (móvil y escritorio)	E-01	SHOULD	**3**	*Historia pequeña. Complementa la identidad institucional y facilita la visita física al recinto.*
PBI-16	Sección "Políticas de Cancelación y Reembolso": subtítulos, párrafos y fecha de vigencia desde footer	E-01	SHOULD	**3**	*Reduce incertidumbre contractual antes de contratar. Contenido estático, bajo esfuerzo.*

✅ ***Entregable:*** *MVP completo. El usuario puede conocer, comparar, verificar disponibilidad y contactar. El negocio opera digitalmente de forma autónoma.*

22 SP

Configuración en Jira

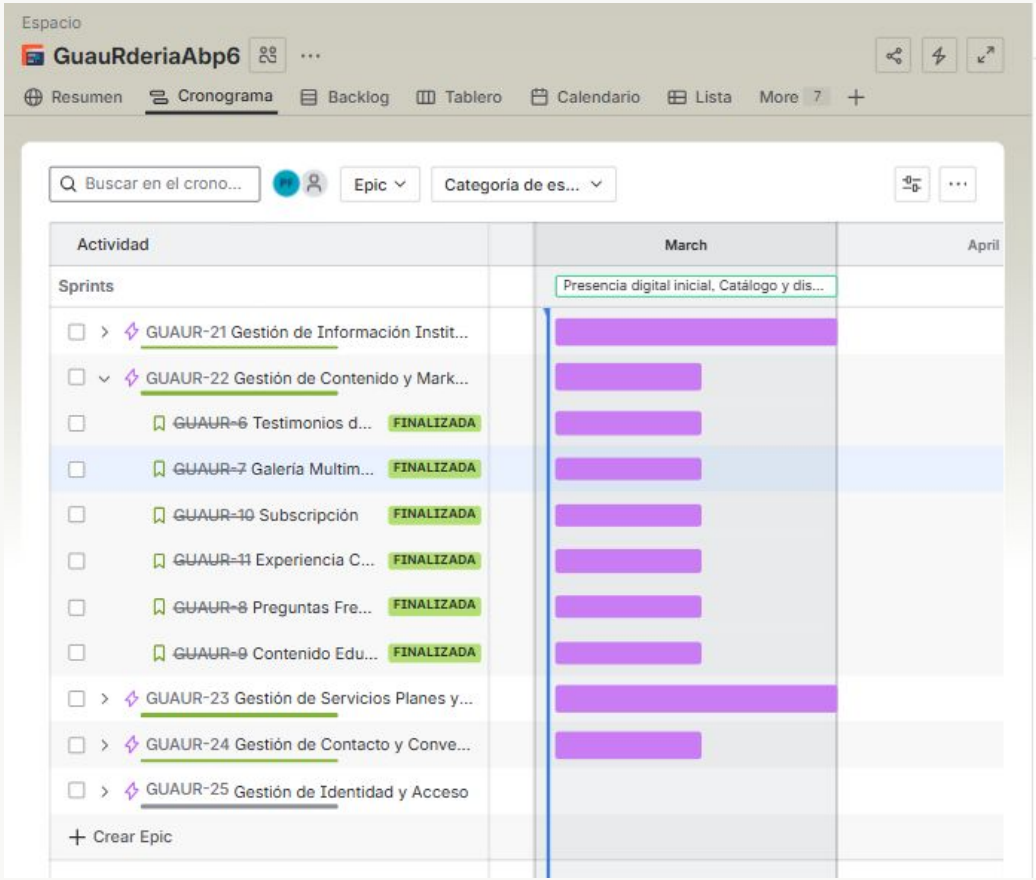

Actividad de Jira

GUAUR-22 / GUAUR-7

Galería Multimedia

Descripción

Historia de usuario: Como usuario no autenticado, quiero acceder a una sección que contenga una galería de imágenes y videos de las instalaciones, para poder conocer el entorno donde se hospedara mi perro.

Criterios de aceptación:

CA-01: El sitio web debe mostrar al menos seis fotografías reales de las instalaciones.

CA-02: El sitio web debe mostrar al menos un video real de las instalaciones.
CA-03: Al seleccionar una imagen, el sitio web debe mostrarla en vista ampliada.
CA-04: En caso de error de carga, el sitio web debe mostrar un elemento alternativo o mensaje informativo.
CA-05: La sección debe estar disponible sin requerir autenticación.

Subtareas

Añadir subtarea

Actividades vinculadas

Sprint 3 — Confianza: evidencia social, credenciales y conversión mejorada

Semanas 5–6 | SHOULD HAVE

SPRINT GOAL

El usuario dispone de evidencia visual y social para confiar en el servicio antes de contactar. El proceso de evaluación inicial cierra con una confirmación formal por correo, mejorando la experiencia post-conversión.

PBI	HISTORIA DE USUARIO (RESUMEN)	ÉPICA	PRIORIDAD	SP	JUSTIFICACIÓN
PBI-04	Sección de ≥3 testimonios de clientes con comentario y referencia identificable	E-02	SHOULD	**3**	*Prueba social. Contenido estático de muy bajo esfuerzo que impacta directamente la tasa de conversión.*
PBI-08	Galería: ≥6 fotos y ≥1 video de instalaciones, vista ampliada, manejo de error de carga	E-02	SHOULD	**8**	*Confianza visual crítica. El tutor necesita ver el entorno antes de dejar a su perro.*
PBI-17	Sección "Certificados y Licencias": visor/imagen/PDF, descarga, mensaje de error	E-01	SHOULD	**5**	*Valida cumplimiento normativo y genera confianza institucional. Complejidad media por visor de documentos.*
PBI-20	Correo de confirmación automático tras envío de formulario de evaluación inicial (depende PBI-05)	E-04	SHOULD	**3**	*Formaliza el proceso de captación. Depende de PBI-05 (Sprint 1). Requiere integración con proveedor de correo.*

✅ ***Entregable:*** *Sitio con credibilidad completa. El ciclo de conversión cierra formalmente con respaldo por correo al usuario.*

19 SP

Configuración en Jira

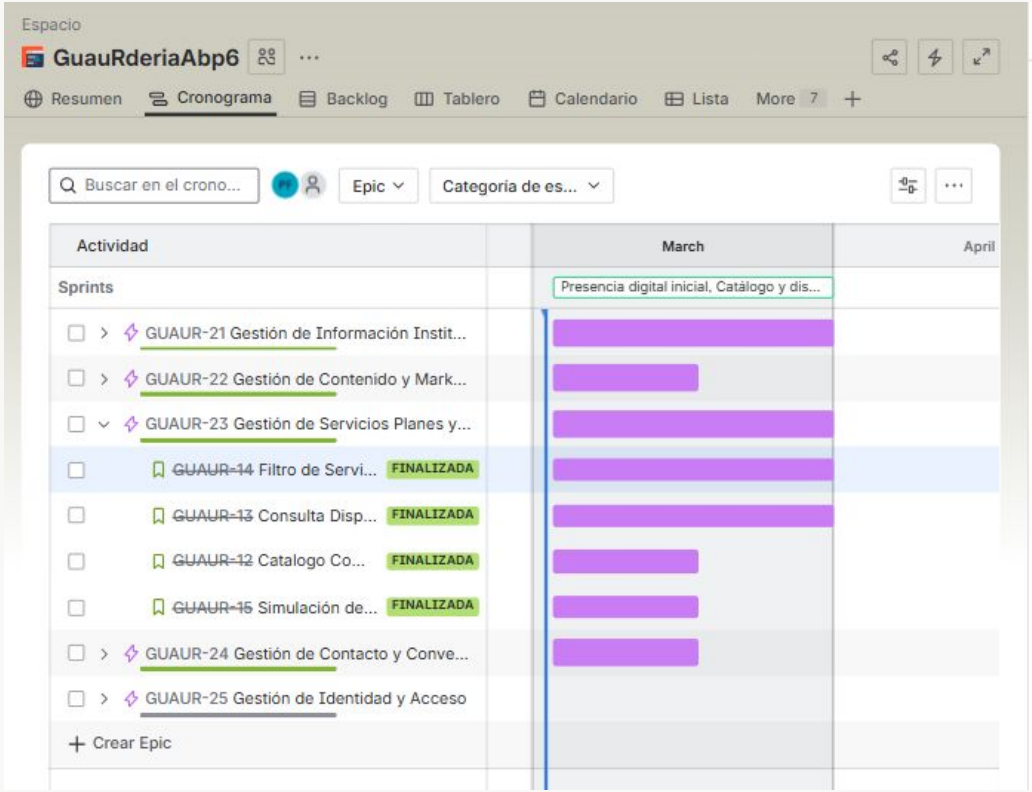

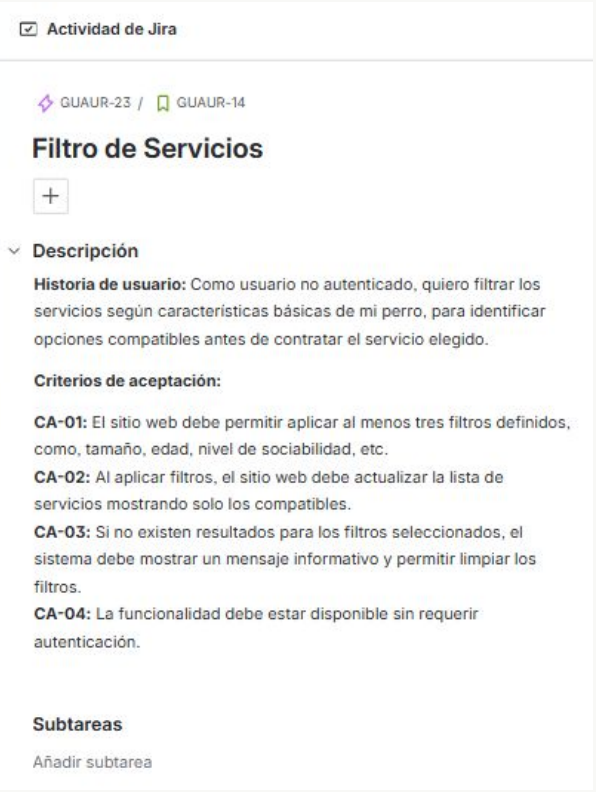

Sprint 4 — Profundidad: herramientas de decisión, contenido educativo y marketing

Semanas 7–8 | COULD HAVE + cierre

SPRINT GOAL

El usuario dispone de herramientas avanzadas para tomar una decisión informada (calculadora, filtros) y puede autoeducarse sobre bienestar canino. El negocio inicia su estrategia de marketing directo con el newsletter.

PBI	HISTORIA DE USUARIO (RESUMEN)	ÉPICA	PRIORIDAD	SP	JUSTIFICACIÓN
PBI-09	Filtro de servicios por ≥3 criterios del perro (tamaño, edad, sociabilidad) con mensaje si no hay resultados	E-03	SHOULD	3	*Depende de PBI-02. Mejora usabilidad del catálogo a medida que crece la oferta de servicios.*
PBI-15	Calculadora de costo estimado: servicio + fechas + parámetro adicional, resultado en moneda definida	E-03	COULD	13	*Ayuda a decidir la compra pero ya hay catálogo con precios. Depende de PBI-02. Requiere reglas de negocio definidas.*
PBI-10	Sección FAQ con ≥4 preguntas, acordeón expandible/colapsable	E-02	COULD	3	*Reduce consultas repetidas al establecimiento. Contenido estático de bajo esfuerzo.*
PBI-19	Sección "Rutina Diaria" organizada en bloques horarios o etapas del día	E-02	COULD	3	*Transparencia operativa. Refuerza la decisión de compra al mostrar el cuidado que recibirá el perro.*
PBI-14	Sección "Consejos y Recomendaciones" con ≥5 bloques temáticos sobre bienestar canino, responsiva	E-02	COULD	5	*Posicionamiento y marketing de contenidos. Sin dependencias técnicas. Muy bajo esfuerzo.*
PBI-18	Suscripción por correo: campo, validación de formato, confirmación, control de duplicados	E-02	COULD	5	*Estrategia de marketing a mediano plazo. Requiere integración de correo (ya resuelta en Sprint 3 con PBI-20).*

Configuración en Jira

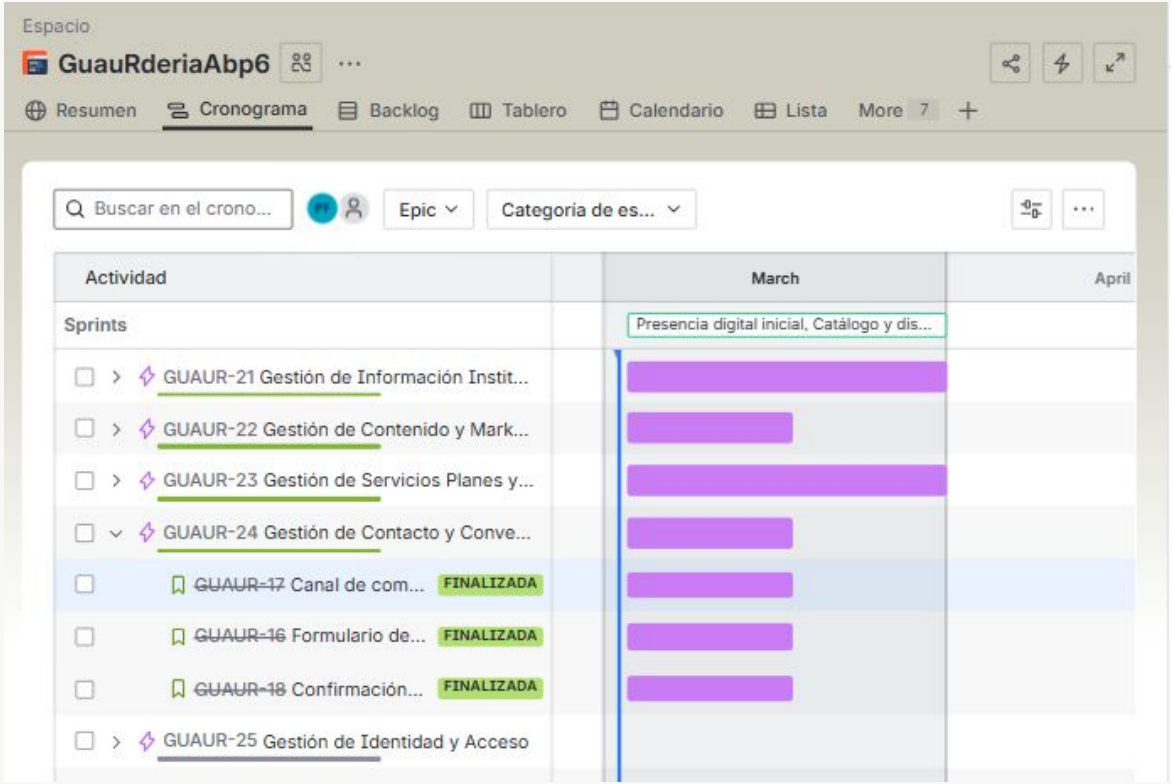

Won’t Have - Fuera del alcance del MVP

🟩 WON'T HAVE — Fuera del alcance del MVP

Las siguientes historias no son necesarias para que el sitio público opere y genere clientes. Se recomienda evaluarlas en una futura **Épica E-06: Gestión de cuenta de usuario**, cuando el negocio identifique funcionalidades transaccionales que requieran autenticación (historial de reservas, pagos en línea, perfil de mascota, etc.).

PBI-06 Registro de usuario	**PBI-07** Recuperación de contraseña

Roadmap de entrega de valor

SPRINT	SEMANAS	PBIS	SP	CAPACIDAD HABILITADA AL TERMINAR
S1	1–2	PBI-01, 13, 12, 05	**15**	Sitio visible · Requisitos de admisión · WhatsApp activo · Formulario de leads funcionando
S2	3–4	PBI-02, 03, 11, 16	**22**	**MVP completo** · Catálogo comparativo · Consulta de disponibilidad · Mapa · Políticas
S3	5–6	PBI-04, 08, 17, 20	**19**	Testimonios · Galería · Certificados · Confirmación por correo automática
S4	7–8	PBI-09, 15, 10, 19, 14, 18	**32**	Filtros · Calculadora · FAQ · Rutina diaria · Contenido educativo · Newsletter
Total	**8 sem.**	**18 PBIs**	88	**Sitio web completo orientado a conversión, listo para producción**

Notas del Product Owner

Decisiones de backlog pendientes antes de Sprint 2:

(a) Definir reglas de negocio de disponibilidad: ¿cuántos cupos por día/servicio?, ¿bloqueos manuales?

(b) Confirmar tarifas y parámetros del calculador (PBI-15) para que el equipo pueda estimarlo con precisión.

(c) Seleccionar proveedor de correo transaccional (Resend, SendGrid, SMTP propio) antes de Sprint 3.

(d) Solicitar al cliente los activos multimedia (fotos, videos, certificados) durante el Sprint 1, no después.

Definition of Done sugerida: Criterios de aceptación verificados por QA · Responsividad probada en móvil, tablet y escritorio · Sin errores de consola en staging · Aprobación del PO en Sprint Review · Código revisado por al menos un par.

Velocidad asumida: 20–22 SP por sprint para equipo de 2–3 devs + 1 UX. Recalibrar tras Sprint 1 con la velocidad real del equipo. Si el Sprint 4 excede la capacidad, mover PBI-15 y PBI-18 a un Sprint 5 de estabilización.

Métricas del proyecto

Informe de Velocidad

La velocidad mide cuántos story points completa el equipo por sprint. Una velocidad creciente indica que el equipo gana fluidez y predictibilidad a lo largo del proyecto. El promedio acumulado sirve para planificar futuros sprints con mayor precisión.

PRESENCIA DIGITAL INICIAL	CATÁLOGO Y DISPONIBILIDAD	CONFIANZA	PROFUNDIDAD
Conf: **15** Comp: **15**	Conf: **22** Comp: **22**	Conf: **19** Comp: **19**	Conf: **32** Comp: **32**

Burndown Chart — Trabajo pendiente por sprint

El burndown muestra cómo se reduce el trabajo pendiente (story points restantes) día a día dentro de cada sprint. Una curva que desciende de forma constante indica un ritmo de entrega saludable y predecible. Cada área de color representa un sprint distinto.

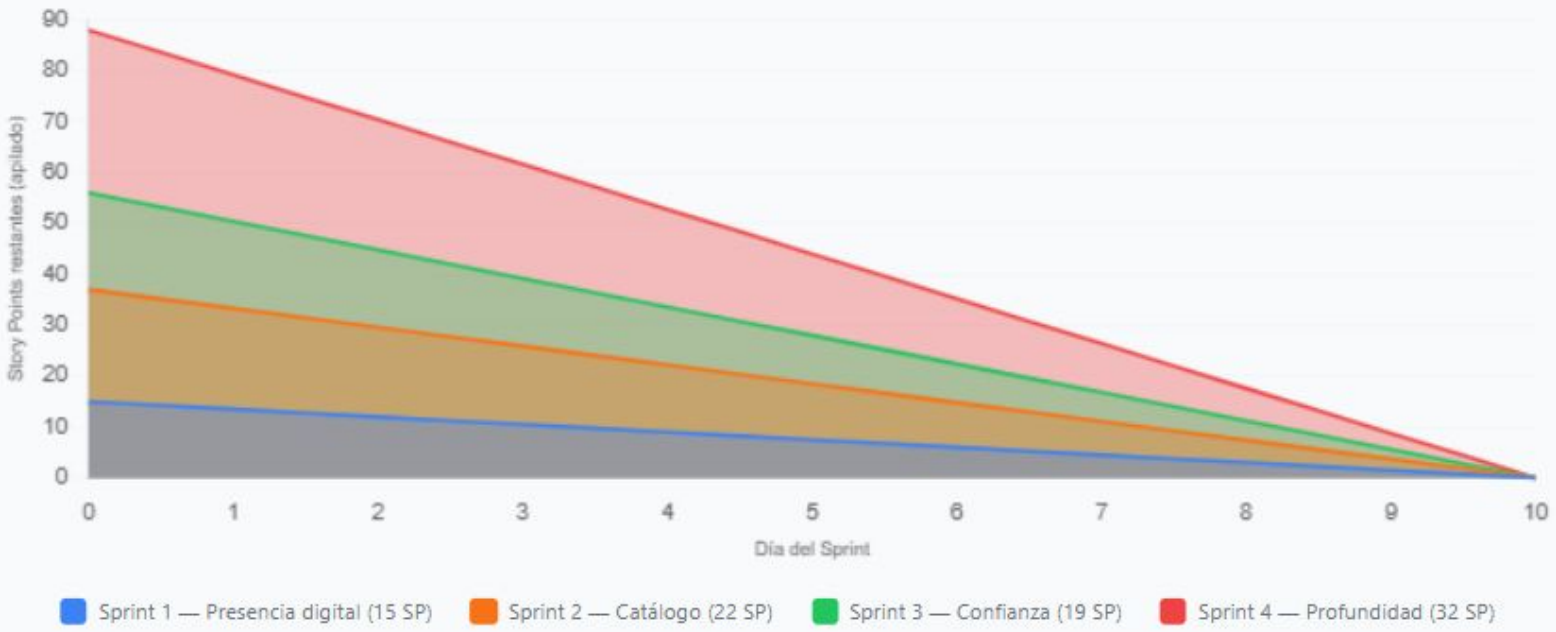

Control Chart — Duración de ciclo promedio por sprint

El Control Chart mide cuántos días tarda en promedio una historia de usuario desde que se inicia hasta que se completa. Una tendencia descendente indica que el equipo es cada vez más eficiente. La reducción de 4,2 a 2,8 días entre el Sprint 1 y el Sprint 4 refleja una mejora significativa en el flujo de trabajo del equipo.

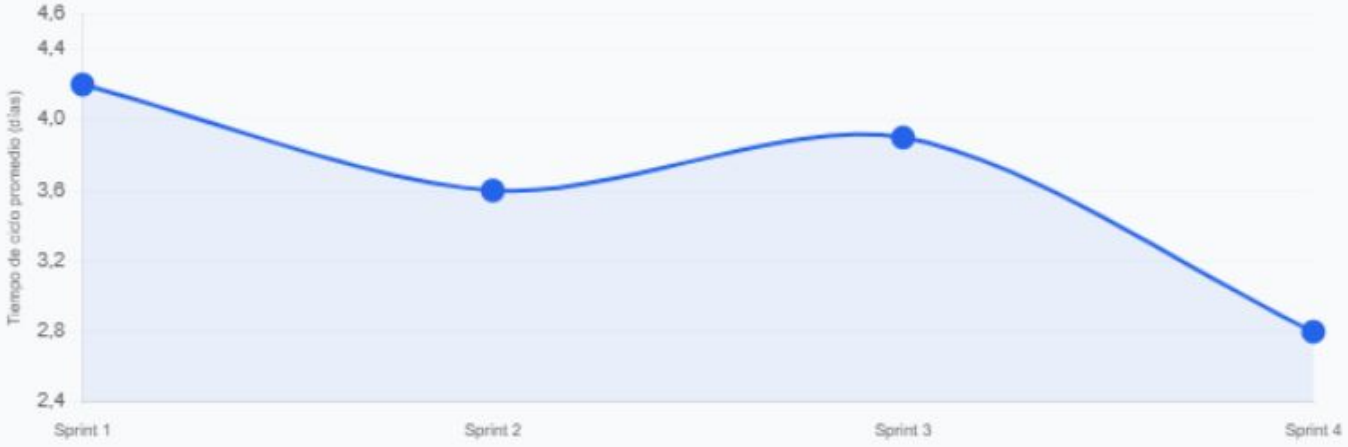

SPRINT 1	SPRINT 2	SPRINT 3	SPRINT 4
4,2	**3,6**	**3,9**	**2,8**
días/historia	días/historia	días/historia	días/historia

📉 **Interpretación:** El alza en Sprint 3 (3,9 días) respecto al Sprint 2 (3,6 días) es esperable: las historias de ese sprint incluyen integración de correo y visor de documentos, que son más complejas. La caída fuerte en Sprint 4 (2,8 días) indica que el equipo dominó los patrones de desarrollo y mejoró su predictibilidad hacia el final del proyecto.
